
		Nome	Duração	Fim	COTA	COTR	BAC
1		**Prisma — Rede Social de E...**	**55 dias**	**05/11/2026 17:00**	**R$ 5280,06**	**R$ 5280,06**	**R$ 7680,06**
2	✔	**Release 00 — Análise e ...**	**44 dias**	**20/10/2026 17:00**	**R$ 2760,06**	**R$ 2760,06**	**R$ 2760,06**
3	✔	Elaborar o Documento d...	5 dias	24/08/2026 17:00	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
4	✔	Revisão cruzada do DRE	1 dia	25/08/2026 17:00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
5	✔	Estimativa de tamanho e ...	5 dias	31/08/2026 17:00	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 480,00
6	✔	Cronograma no MS Proj...	5 dias	31/08/2026 17:00	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 480,00
7	✔	Plano de comunicação	3 dias	10/09/2026 17:00	R$ 160,03	R$ 160,03	R$ 160,03
8	✔	Identificação e análise de...	3 dias	17/09/2026 17:00	R$ 160,03	R$ 160,03	R$ 160,03
9	✔	Matriz de rastreabilidade ...	5 dias	19/10/2026 17:00	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
10	✔	Plano de projeto	5 dias	19/10/2026 17:00	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
11	✔	Branch de análise no Git ...	1 dia	20/10/2026 17:00	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
12	✔	Entrega da Release 00	0 dias	22/10/2026 08:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13	✔	**Release 01 — CRUDs de...**	**5 dias**	**29/10/2026 17:00**	**R$ 2520,00**	**R$ 2520,00**	**R$ 2520,00**
14	✔	Configurar projeto Angu...	1 dia	23/10/2026 17:00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
15	✔	Configurar o Mantis	1 dia	23/10/2026 17:00	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
16	✔	CRUD de Usuário/Perfil (...	2 dias	27/10/2026 17:00	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
17	✔	CRUD de Publicação (RF...	2 dias	27/10/2026 17:00	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
18	✔	Testes automatizados co...	1 dia	28/10/2026 17:00	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
19	✔	Registro de bugs no Mantis	1 dia	28/10/2026 17:00	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
20	✔	Atualizar DRE e matriz de...	1 dia	28/10/2026 17:00	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
21	✔	Atualizar cronograma (tr...	1 dia	28/10/2026 17:00	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
22	✔	Status Report da Release 01	1 dia	28/10/2026 17:00	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
23	✔	Baseline de configuração...	1 dia	29/10/2026 17:00	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
24	✔	Apresentação da Release ...	1 dia	29/10/2026 17:00	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
25	✔	Entrega da Release 01	0 dias	30/10/2026 08:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26		**Release 02 — CRUDs de...**	**5 dias**	**05/11/2026 17:00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2400,00**
27		Planejar a Release 02 e at..	1 dia	30/10/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
28		Corrigir pendências da R...	1 dia	30/10/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Completo por cento	Início	Antecessores	Nomes dos Recursos
81%	**18/08/2026 08:00**		
100%	**18/08/2026 08:00**		
100%	18/08/2026 08:00		Eduarda Baziotti[10%];Gustav...
100%	25/08/2026 08:00	3	Eduarda Baziotti[12%];Gustav...
100%	25/08/2026 08:00	3	Gustavo Barbosa Gonçalves[15...
100%	25/08/2026 08:00	3	Eduarda Baziotti[15%];Ottávio...
100%	08/09/2026 08:00	6	Eduarda Baziotti[17%]
100%	15/09/2026 08:00	5	Rafael Lemes Scarpel[17%]
100%	13/10/2026 08:00	4	Ottávio Lucri de Souza[10%];...
100%	13/10/2026 08:00	5;6;7;8	Eduarda Baziotti[10%];Rafael L...
100%	20/10/2026 08:00	9;10	Eduarda Baziotti[12%]
100%	22/10/2026 08:00	11	
100%	**23/10/2026 08:00**		
100%	23/10/2026 08:00	12	Eduarda Baziotti[50%]
100%	23/10/2026 08:00	12	Ottávio Lucri de Souza[25%]
100%	26/10/2026 08:00	14	Eduarda Baziotti[50%];Gustav...
100%	26/10/2026 08:00	14	Ottávio Lucri de Souza[50%];...
100%	28/10/2026 08:00	16;17	Gustavo Barbosa Gonçalves[50...
100%	28/10/2026 08:00	16;17;15	Ottávio Lucri de Souza[25%]
100%	28/10/2026 08:00	16;17	Ottávio Lucri de Souza[25%]
100%	28/10/2026 08:00	16;17	Eduarda Baziotti[25%]
100%	28/10/2026 08:00	16;17	Eduarda Baziotti[25%]
100%	29/10/2026 08:00	18;19;20;21;22	Eduarda Baziotti[12%]
100%	29/10/2026 08:00	18;19;20;21;22	Eduarda Baziotti[25%];Gustav...
100%	30/10/2026 08:00	23;24	
0%	**30/10/2026 08:00**		
0%	30/10/2026 08:00	25	Eduarda Baziotti[38%]
0%	30/10/2026 08:00	25	Gustavo Barbosa Gonçalves[38...

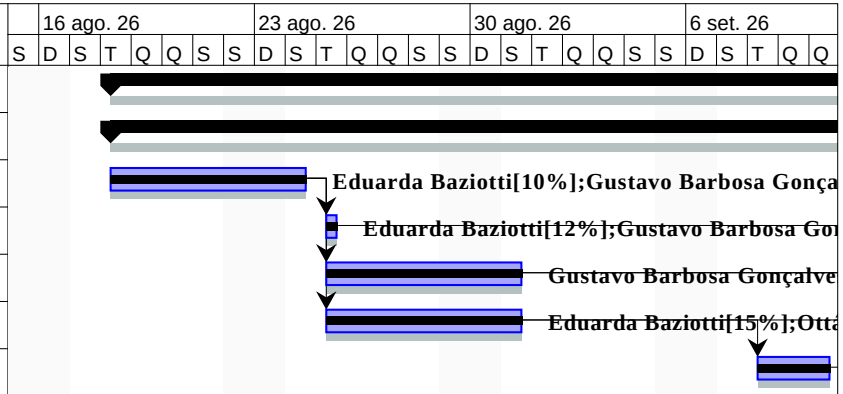


13 set. 26
20 set. 26
27 set. 26
4 out. 26
11 out. 26
18 out. 26
25 out. 26
1 nov. 26
8 nov. 26
15 nov. 2
S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T
lves[10%];Ottávio Lucri de Souza[10%];Rafael Lemes Scarpel[10%]
nçalves[12%];Ottávio Lucri de Souza[12%];Rafael Lemes Scarpel[12%]
s[15%];Rafael Lemes Scarpel[15%]
ívio Lucri de Souza[15%]
Eduarda Baziotti[17%]
Rafael Lemes Scarpel[17%]
Ottávio Lucri de Souza[10%];Gustavo Barbosa Gonçalves[10%]
Eduarda Baziotti[10%];Rafael Lemes Scarpel[10%]
Eduarda Baziotti[12%]
22/10
Eduarda Baziotti[50%]
Ottávio Lucri de Souza[25%]
Eduarda Baziotti[50%];Gustavo Barbosa Gonçalves[50%]
Ottávio Lucri de Souza[50%];Rafael Lemes Scarpel[50%]
Gustavo Barbosa Gonçalves[50%];Rafael Lemes Scarpe
Ottávio Lucri de Souza[25%]
Ottávio Lucri de Souza[25%]
Eduarda Baziotti[25%]
Eduarda Baziotti[25%]
Eduarda Baziotti[12%]
Eduarda Baziotti[25%];Gustavo Barbosa Gonçalves[2
30/10
Eduarda Baziotti[38%]
Gustavo Barbosa Gonçalves[38%]


6				22 nov. 26							29 nov. 26						
Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S


l[50%]

5%];Ottávio Lucri de Souza[25%];Rafael Lemes Sca

		Nome	Duração	Fim	COTA	COTR	BAC
29		Modelar os dados de co...	1 dia	30/10/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
30		Prototipar a sala de foco	1 dia	30/10/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
31		CRUD de Comentário (R...	2 dias	04/11/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00
32		CRUD de Sala de Foco (...	2 dias	04/11/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00
33		Testes automatizados co...	1 dia	05/11/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00
34		Registro de bugs no Mantis	1 dia	05/11/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
35		Atualizar cronograma e S...	1 dia	05/11/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
36		Baseline de configuração...	1 dia	05/11/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
37		Apresentação da Release ...	1 dia	05/11/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
38		Entrega da Release 02	0 dias	05/11/2026 17:00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Completo por cento	Início	Antecessores	Nomes dos Recursos
0%	30/10/2026 08:00	25	Ottávio Lucri de Souza[38%]
0%	30/10/2026 08:00	25	Rafael Lemes Scarpel[50%]
0%	03/11/2026 08:00	28;29	Gustavo Barbosa Gonçalves[50...
0%	03/11/2026 08:00	27;30	Eduarda Baziotti[50%];Rafael L...
0%	05/11/2026 08:00	31;32	Gustavo Barbosa Gonçalves[38...
0%	05/11/2026 08:00	31;32	Ottávio Lucri de Souza[12%]
0%	05/11/2026 08:00	31;32	Eduarda Baziotti[38%]
0%	05/11/2026 08:00	31;32	Ottávio Lucri de Souza[12%]
0%	05/11/2026 08:00	31;32	Eduarda Baziotti[12%];Gustav...
0%	05/11/2026 17:00	33;34;35;36;37	

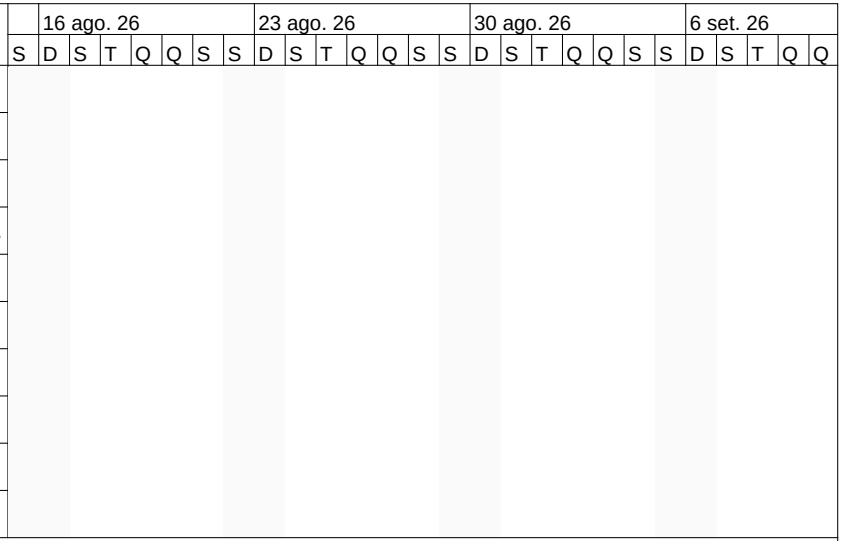

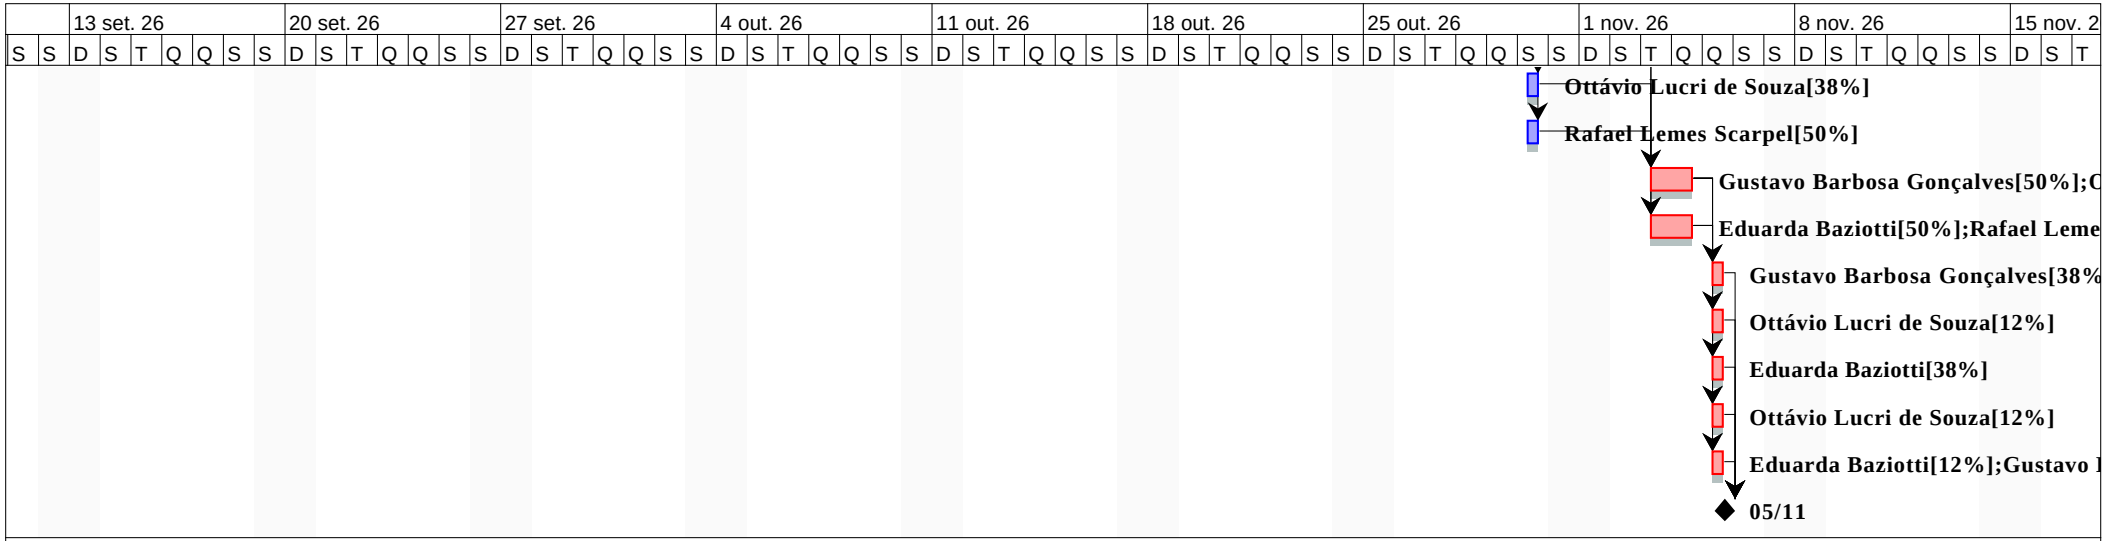
13 set. 26
20 set. 26
27 set. 26
4 out. 26
11 out. 26
18 out. 26
25 out. 26
1 nov. 26
8 nov. 26
15 nov. 2
S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T
Ottávio Lucri de Souza[38%]
Rafael Lemes Scarpel[50%]
Gustavo Barbosa Gonçalves[50%];C
Eduarda Baziotti[50%];Rafael Leme
Gustavo Barbosa Gonçalves[38%
Ottávio Lucri de Souza[12%]
Eduarda Baziotti[38%]
Ottávio Lucri de Souza[12%]
Eduarda Baziotti[12%];Gustavo
05/11

6				22 nov. 26							29 nov. 26						
Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S

)ttávio Lucri de Souza[50%]

s Scarpel[50%]

];Rafael Lemes Scarpel[38%]

Barbosa Gonçalves[12%];Ottávio Lucri de Souza[12%
