

		Nome	Duração	Início	Fim	COTR
1		**Prisma — Rede Social de Estudos**	**55 dias**	**18/08/2026 08:00**	**05/11/2026 17:00**	**R$ 6440,06**
2	✔	**Release 00 — Análise e Planejamento**	**44 dias**	**18/08/2026 08:00**	**20/10/2026 17:00**	**R$ 2760,06**
3	✔	Elaborar o Documento de Requisitos (DRE)	5 dias	18/08/2026 08:00	24/08/2026 17:00	R$ 640,00
4	✔	Revisão cruzada do DRE	1 dia	25/08/2026 08:00	25/08/2026 17:00	R$ 160,00
5	✔	Estimativa de tamanho e esforço	5 dias	25/08/2026 08:00	31/08/2026 17:00	R$ 480,00
6	✔	Cronograma no MS Project	5 dias	25/08/2026 08:00	31/08/2026 17:00	R$ 480,00
7	✔	Plano de comunicação	3 dias	08/09/2026 08:00	10/09/2026 17:00	R$ 160,03
8	✔	Identificação e análise de riscos	3 dias	15/09/2026 08:00	17/09/2026 17:00	R$ 160,03
9	✔	Matriz de rastreabilidade bidirecional	5 dias	13/10/2026 08:00	19/10/2026 17:00	R$ 320,00
10	✔	Plano de projeto	5 dias	13/10/2026 08:00	19/10/2026 17:00	R$ 320,00
11	✔	Branch de análise no Git com os documentos (ta...	1 dia	20/10/2026 08:00	20/10/2026 17:00	R$ 40,00
12	✔	Entrega da Release 00	0 dias	22/10/2026 08:00	22/10/2026 08:00	R$ 0,00
13	✔	**Release 01 — CRUDs de Usuário/Perfil e Publ...**	**5 dias**	**23/10/2026 08:00**	**29/10/2026 17:00**	**R$ 2520,00**
14	✔	Configurar projeto Angular + Firebase	1 dia	23/10/2026 08:00	23/10/2026 17:00	R$ 160,00
15	✔	Configurar o Mantis	1 dia	23/10/2026 08:00	23/10/2026 17:00	R$ 80,00
16	✔	CRUD de Usuário/Perfil (RF01, RF02, RF03, RF19)	2 dias	26/10/2026 08:00	27/10/2026 17:00	R$ 640,00
17	✔	CRUD de Publicação (RF04, RF05, RF06, RF18)	2 dias	26/10/2026 08:00	27/10/2026 17:00	R$ 640,00
18	✔	Testes automatizados com Selenium	1 dia	28/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	R$ 320,00
19	✔	Registro de bugs no Mantis	1 dia	28/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	R$ 80,00
20	✔	Atualizar DRE e matriz de rastreabilidade	1 dia	28/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	R$ 80,00
21	✔	Atualizar cronograma (trabalho real e valor agre...	1 dia	28/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	R$ 80,00
22	✔	Status Report da Release 01	1 dia	28/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	R$ 80,00
23	✔	Baseline de configuração no Git (tag release-01)	1 dia	29/10/2026 08:00	29/10/2026 17:00	R$ 40,00
24	✔	Apresentação da Release 01	1 dia	29/10/2026 08:00	29/10/2026 17:00	R$ 320,00
25	✔	Entrega da Release 01	0 dias	30/10/2026 08:00	30/10/2026 08:00	R$ 0,00
26		**Release 02 — CRUDs de Comentário e Sala de...**	**5 dias**	**30/10/2026 08:00**	**05/11/2026 17:00**	**R$ 1160,00**
27	✔	Planejar a Release 02 e atualizar DRE/matriz	1 dia	30/10/2026 08:00	30/10/2026 17:00	R$ 120,00
28	✔	Corrigir pendências da Release 01	1 dia	30/10/2026 08:00	30/10/2026 17:00	R$ 120,00

COTA	BAC	Completo por cento	Antecessores	Nomes dos Recursos
R$ 6440,06	**R$ 7680,06**	**96%**		
R$ 2760,06	**R$ 2760,06**	**100%**		
R$ 640,00	R$ 640,00	100%		Eduarda Baziotti[10%];Gustav...
R$ 160,00	R$ 160,00	100%	3	Eduarda Baziotti[12%];Gustav...
R$ 480,00	R$ 480,00	100%	3	Gustavo Barbosa Gonçalves[15...
R$ 480,00	R$ 480,00	100%	3	Eduarda Baziotti[15%];Ottávio...
R$ 160,03	R$ 160,03	100%	6	Eduarda Baziotti[17%]
R$ 160,03	R$ 160,03	100%	5	Rafael Lemes Scarpel[17%]
R$ 320,00	R$ 320,00	100%	4	Ottávio Lucri de Souza[10%];...
R$ 320,00	R$ 320,00	100%	5;6;7;8	Eduarda Baziotti[10%];Rafael L...
R$ 40,00	R$ 40,00	100%	9;10	Eduarda Baziotti[12%]
R$ 0,00	R$ 0,00	100%	11	
R$ 2520,00	**R$ 2520,00**	**100%**		
R$ 160,00	R$ 160,00	100%	12	Eduarda Baziotti[50%]
R$ 80,00	R$ 80,00	100%	12	Ottávio Lucri de Souza[25%]
R$ 640,00	R$ 640,00	100%	14	Eduarda Baziotti[50%];Gustav...
R$ 640,00	R$ 640,00	100%	14	Ottávio Lucri de Souza[50%];...
R$ 320,00	R$ 320,00	100%	16;17	Gustavo Barbosa Gonçalves[50...
R$ 80,00	R$ 80,00	100%	16;17;15	Ottávio Lucri de Souza[25%]
R$ 80,00	R$ 80,00	100%	16;17	Ottávio Lucri de Souza[25%]
R$ 80,00	R$ 80,00	100%	16;17	Eduarda Baziotti[25%]
R$ 80,00	R$ 80,00	100%	16;17	Eduarda Baziotti[25%]
R$ 40,00	R$ 40,00	100%	18;19;20;21;22	Eduarda Baziotti[12%]
R$ 320,00	R$ 320,00	100%	18;19;20;21;22	Eduarda Baziotti[25%];Gustav...
R$ 0,00	R$ 0,00	100%	23;24	
R$ 1160,00	**R$ 2400,00**	**81%**		
R$ 120,00	R$ 120,00	100%	25	Eduarda Baziotti[38%]
R$ 120,00	R$ 120,00	100%	25	Gustavo Barbosa Gonçalves[38...

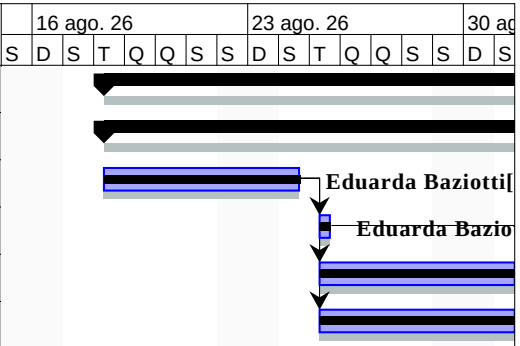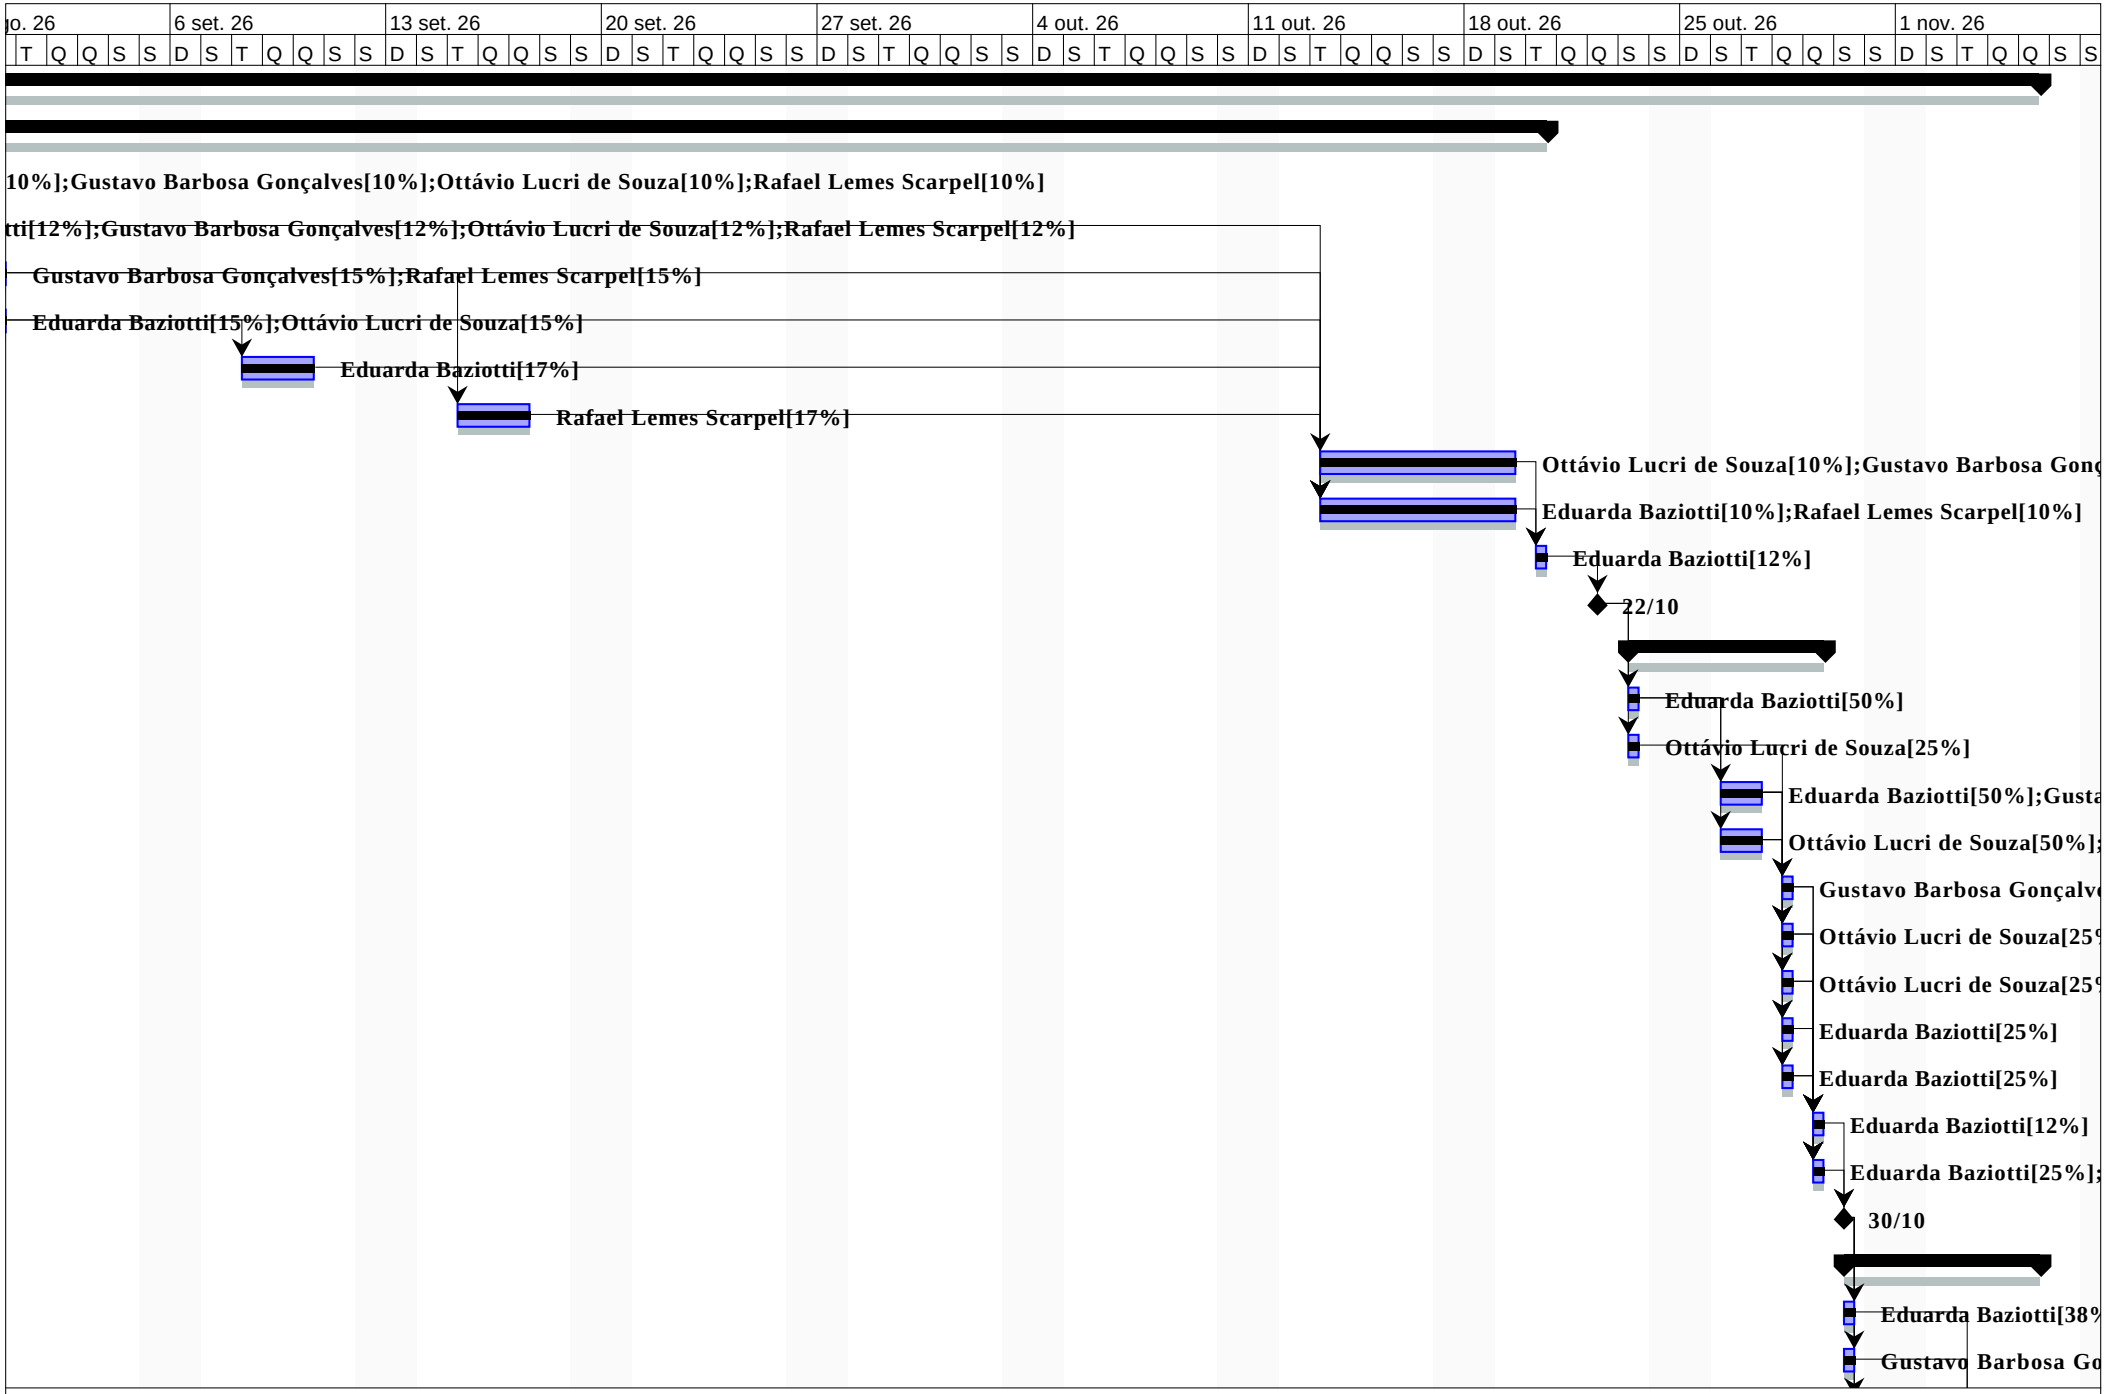


o. 26
6 set. 26
13 set. 26
20 set. 26
27 set. 26
4 out. 26
11 out. 26
18 out. 26
25 out. 26
1 nov. 26
10%];Gustavo Barbosa Gonçalves[10%];Ottávio Lucri de Souza[10%];Rafael Lemes Scarpel[10%]
tti[12%];Gustavo Barbosa Gonçalves[12%];Ottávio Lucri de Souza[12%];Rafael Lemes Scarpel[12%]
Gustavo Barbosa Gonçalves[15%];Rafael Lemes Scarpel[15%]
Eduarda Baziotti[15%];Ottávio Lucri de Souza[15%]
Eduarda Baziotti[17%]
Rafael Lemes Scarpel[17%]
Ottávio Lucri de Souza[10%];Gustavo Barbosa Gonç
Eduarda Baziotti[10%];Rafael Lemes Scarpel[10%]
Eduarda Baziotti[12%]
22/10
Eduarda Baziotti[50%]
Ottávio Lucri de Souza[25%]
Eduarda Baziotti[50%];Gusta
Ottávio Lucri de Souza[50%];
Gustavo Barbosa Gonçalv
Ottávio Lucri de Souza[25
Ottávio Lucri de Souza[25
Eduarda Baziotti[25%]
Eduarda Baziotti[25%]
Eduarda Baziotti[12%]
Eduarda Baziotti[25%];
30/10
Eduarda Baziotti[38%
Gustavo Barbosa Go

	8 nov. 26							15 nov. 26							22 nov. 26							29 nov. 26							6 d
	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D

çalves[10%]

avo Barbosa Gonçalves[50%]

Rafael Lemes Scarpel[50%]

es[50%];Rafael Lemes Scarpel[50%]

%]

%]


Gustavo Barbosa Gonçalves[25%];Ottávio Lucri de Souza[25%];Rafael Lemes Scarpe


%]

nçalves[38%]

		Nome	Duração	Início	Fim	COTR
29	✔	Modelar os dados de comentários	1 dia	30/10/2026 08:00	30/10/2026 17:00	R$ 120,00
30	✔	Prototipar a sala de foco	1 dia	30/10/2026 08:00	30/10/2026 17:00	R$ 160,00
31	✔	CRUD de Comentário (RF08)	2 dias	03/11/2026 08:00	04/11/2026 17:00	R$ 320,00
32	✔	CRUD de Sala de Foco (RF14 a RF17)	2 dias	03/11/2026 08:00	04/11/2026 17:00	R$ 320,00
33	✔	Testes automatizados com Selenium	1 dia	05/11/2026 08:00	05/11/2026 17:00	R$ 0,00
34	✔	Registro de bugs no Mantis	1 dia	05/11/2026 08:00	05/11/2026 17:00	R$ 0,00
35	✔	Atualizar cronograma e Status Report da Release 02	1 dia	05/11/2026 08:00	05/11/2026 17:00	R$ 0,00
36	✔	Baseline de configuração no Git (tag release-02)	1 dia	05/11/2026 08:00	05/11/2026 17:00	R$ 0,00
37		Apresentação da Release 02	1 dia	05/11/2026 08:00	05/11/2026 17:00	R$ 0,00
38		Entrega da Release 02	0 dias	05/11/2026 17:00	05/11/2026 17:00	R$ 0,00

COTA	BAC	Completo por cento	Antecessores	Nomes dos Recursos
R$ 120,00	R$ 120,00	100%	25	Ottávio Lucri de Souza[38%]
R$ 160,00	R$ 160,00	100%	25	Rafael Lemes Scarpel[50%]
R$ 320,00	R$ 640,00	100%	28;29	Gustavo Barbosa Gonçalves[50...
R$ 320,00	R$ 640,00	100%	27;30	Eduarda Baziotti[50%];Rafael L...
R$ 0,00	R$ 240,00	100%	31;32	Gustavo Barbosa Gonçalves[38...
R$ 0,00	R$ 40,00	100%	31;32	Ottávio Lucri de Souza[12%]
R$ 0,00	R$ 120,00	100%	31;32	Eduarda Baziotti[38%]
R$ 0,00	R$ 40,00	100%	31;32	Ottávio Lucri de Souza[12%]
R$ 0,00	R$ 160,00	0%	31;32	Eduarda Baziotti[12%];Gustav...
R$ 0,00	R$ 0,00	0%	33;34;35;36;37	

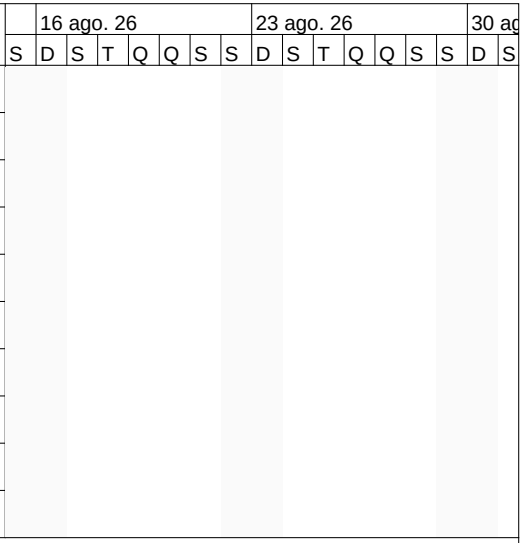

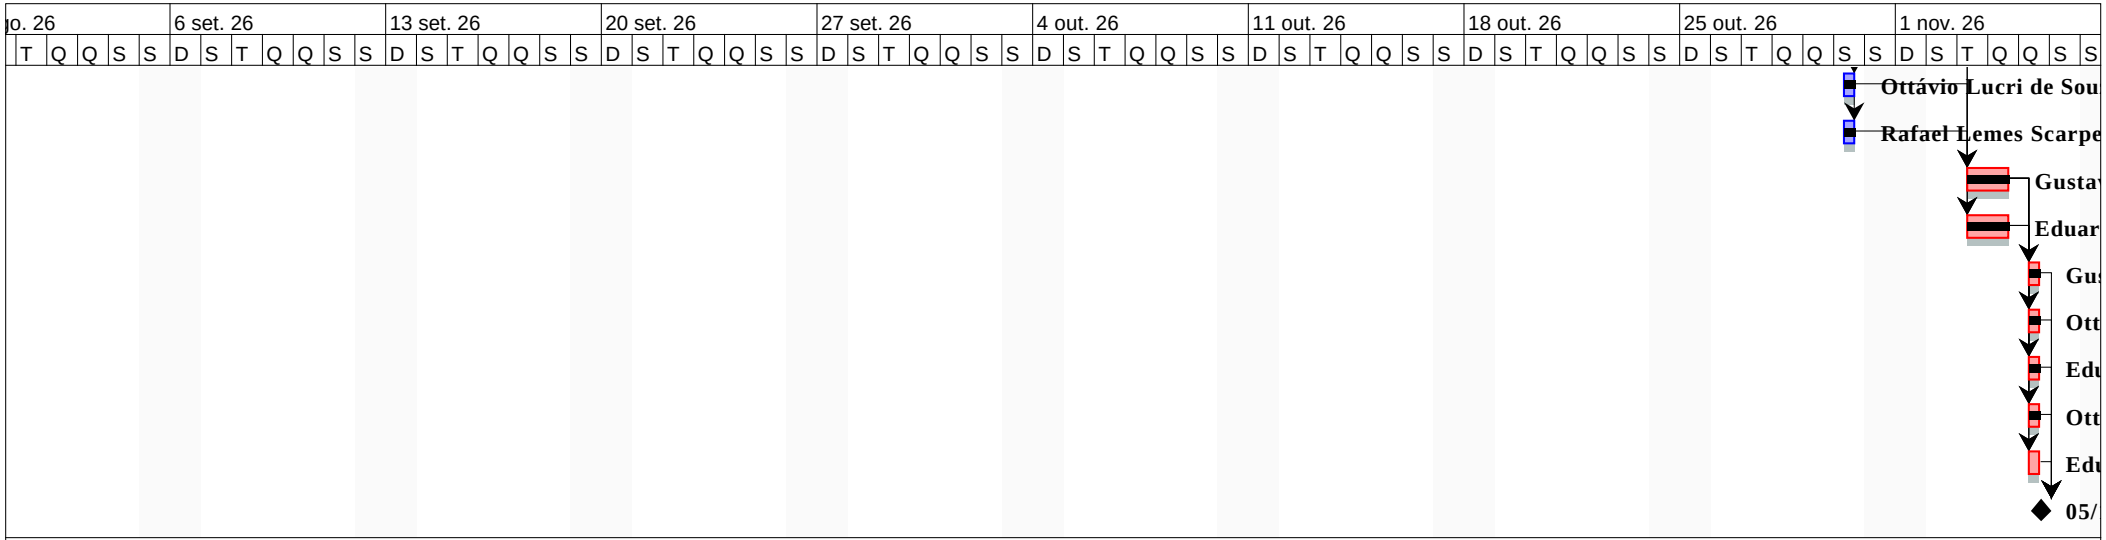
o. 26
6 set. 26
13 set. 26
20 set. 26
27 set. 26
4 out. 26
11 out. 26
18 out. 26
25 out. 26
1 nov. 26
T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
Ottávio Lucri de Sou
Rafael Lemes Scarpe
Gustav
Eduar
Gus
Ott
Edu
Ott
Edu
05/

	8 nov. 26							15 nov. 26							22 nov. 26							29 nov. 26							6 d
	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
za[38%]																													
l[50%]																													
vo Barbosa Gonçalves[50%];Ottávio Lucri de Souza[50%]																													
da Baziotti[50%];Rafael Lemes Scarpel[50%]																													
stavo Barbosa Gonçalves[38%];Rafael Lemes Scarpel[38%]																													
ávio Lucri de Souza[12%]																													
ıarda Baziotti[38%]																													
ávio Lucri de Souza[12%]																													
ıarda Baziotti[12%];Gustavo Barbosa Gonçalves[12%];Ottávio Lucri de Souza[12%];																													
11																													
